



Zkušenosti ORP Kladno s projekty eGovernmentu

Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous

Atakované výzvy



Statutární město KLADNO

Operační program / číslo výzvy	Název projektu	Předpokl. způs. výdaje / obecní rozpočet	Stav	Začátek/konec projektu
IOP / č. 06	I.Vybudování TC a II. pořízení eSSL	5 234 000,- Kč/ 785 100,- Kč	Projekt v realizaci	1.6.2009 / 31.5.2011
IOP / č. 09	Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno	43 428 000,- Kč/ 6 516 200,- Kč	27.9.2010 – podána žádost	15.6.2010 / 31.12.2011
IOP / č. 09	Optická komunik. síť Statut. města Kladna	51 680 225,- Kč/ 7 752 034,- Kč	22.11.2010 – podána žádost	21.9.2010/ 31.12.2012
OP LZZ / č. 40	Vzdělávání v eGovern. v ORP Kladno	2 002 250,- Kč/ 300 337,- Kč	Projekt v realizaci	1.9.2009 / 30.8.2012
OP LZZ / č.57	Řízení lidských zdrojů v ORP Kladno	6 004 160,- Kč/ 900 624,- Kč	Projekt v realizaci	1.1.2011 / 31.12.2012
OP LZZ / č.69	Vzdělávání pro Statut. město Kladno	9 192 088,- Kč/ 1 378 813,- Kč	30.11.2010 – podána žádost	1.9.2011/ 31.8.2014



- **Řešeno v rámci výzvy:**
 - Část I. – Zřízení TC ORP Kladno – 3,2 mil. Kč
 - Část II. – Pořízení SSL pro spr. ob.- 1,5 mil. Kč
- Únor 2010 – **podána žádost o dotaci** na projekt „Technologické centrum ORP Kladno a elektronické spisové služby v území“
- Srpen 2010 – **VZ na SSL**
- Září 2010 – **VZ na TC ORP Kladno**
- Leden 2011 – **přidělena dotace**
- Březen 2011 – **vše nainstalováno**

Výzva 06 - IOP



Statutární město Kladno

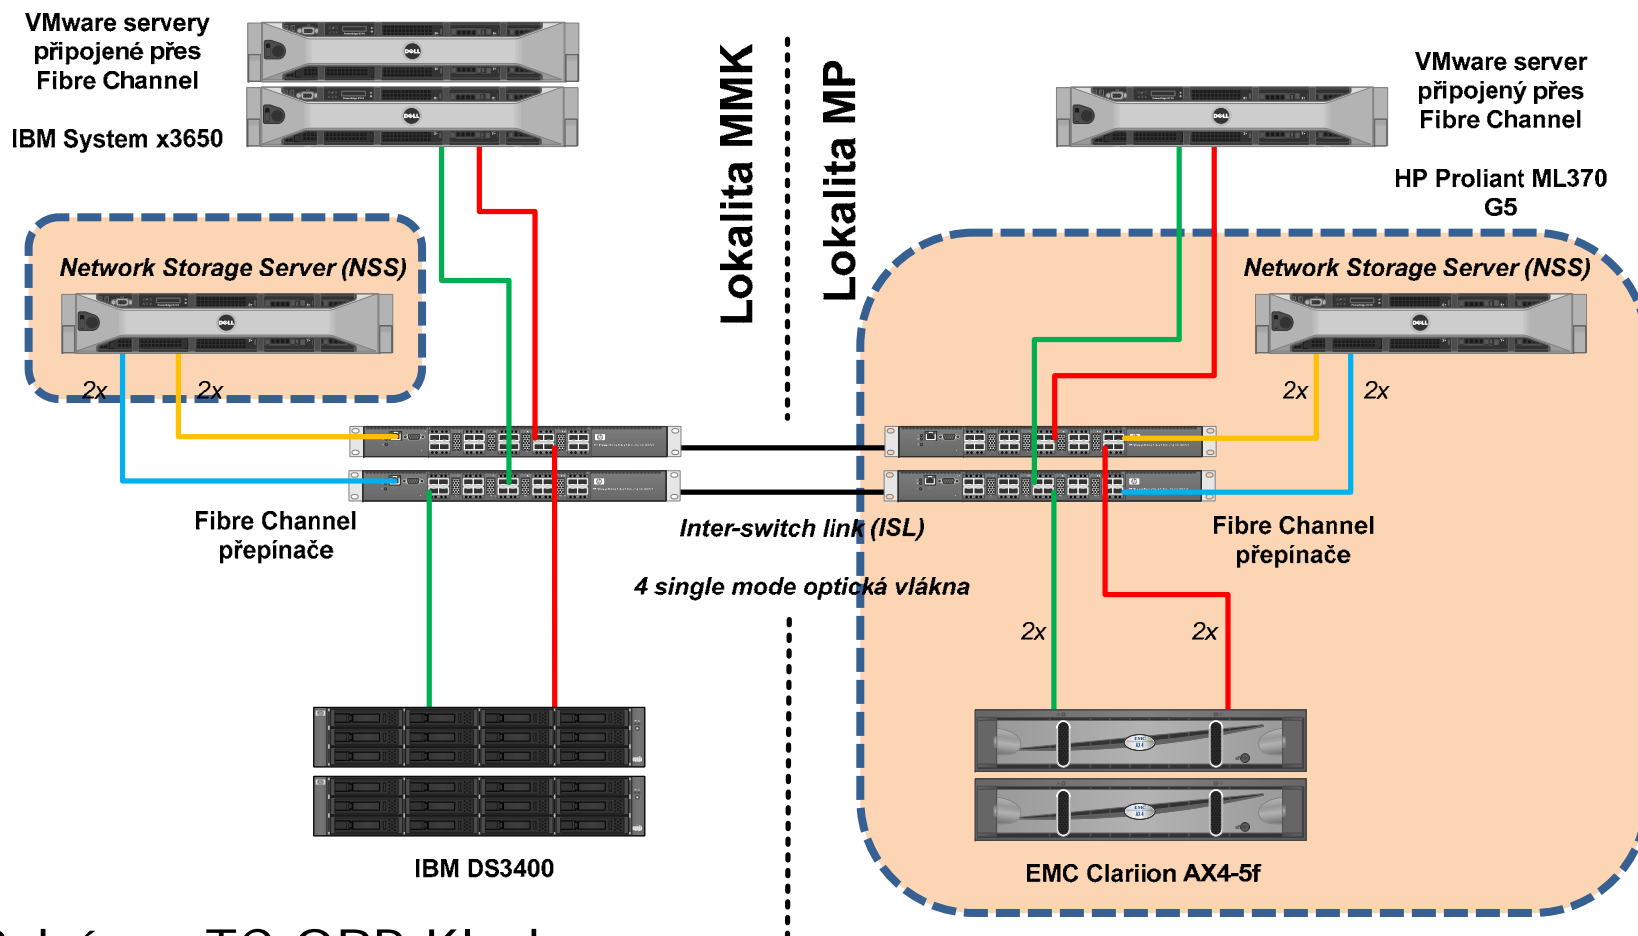


Schéma TC ORP Kladno



- **Kde jsme narazili:**
 - dlouhá doba schvalování dotace – z 3 etap 1
 - VZ malého rozsahu na SP - schváleno na CRR, přesto neuznatelné výdaje - netransparentnost dle hodnotícího kritéria „složení řešitelského týmu“ (ve Výzvě nedostatečně vysvětlený postup hodnocení)
 - na konci roku 2010 byl vybrán dodavatel, podpis právního aktu na začátku roku 2011, problém s držením nabídnuté ceny na přelomu roku – podařilo se !
 - problém s napojení TC ORP na TC SČ kraje
 - Nutnost vypovědět předchozí smlouvy na SSL
 - Neuvažované „vedlejší“ výdaje



„Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“

- Září 2010 – podána žádost o dotaci
- 2011 – příprava VZ Projekt. dozor a VZ Realizace
- Finanční objem – 43 mil. Kč
- Komponenty:
 - **Integrace agend IS** (výměnou některých modulů).
 - **Centrální identifikace** uživ. a správa oprávnění.
 - **Formulářový systém** a workflow dokumentů.
 - **Komunikační portál** (občan, úředník a manažer).
 - **Call centrum** (hlasová komunikace úřadu s veřejností).
 - Výhledově kontaktní centrum pro občany.




„Optická komunikační síť Statutárního města Kladna “

- Listopad 2010 – podána žádost o dotaci
- 2011 – čekáme na rozhodnutí
- Připojované destinace:
 - Objekty města, ZŠ a MŠ, střední a vyšší školy.
 - Další městem založené a zřizované subjekty.
 - Bezpečnostní kamery a radary MP, složky IZS.
 - Informační tabule, řadiče křižovatek a další.
- Finanční objem – 51 mil. Kč

Výzva 09 - IOP



Statutární město Kladno

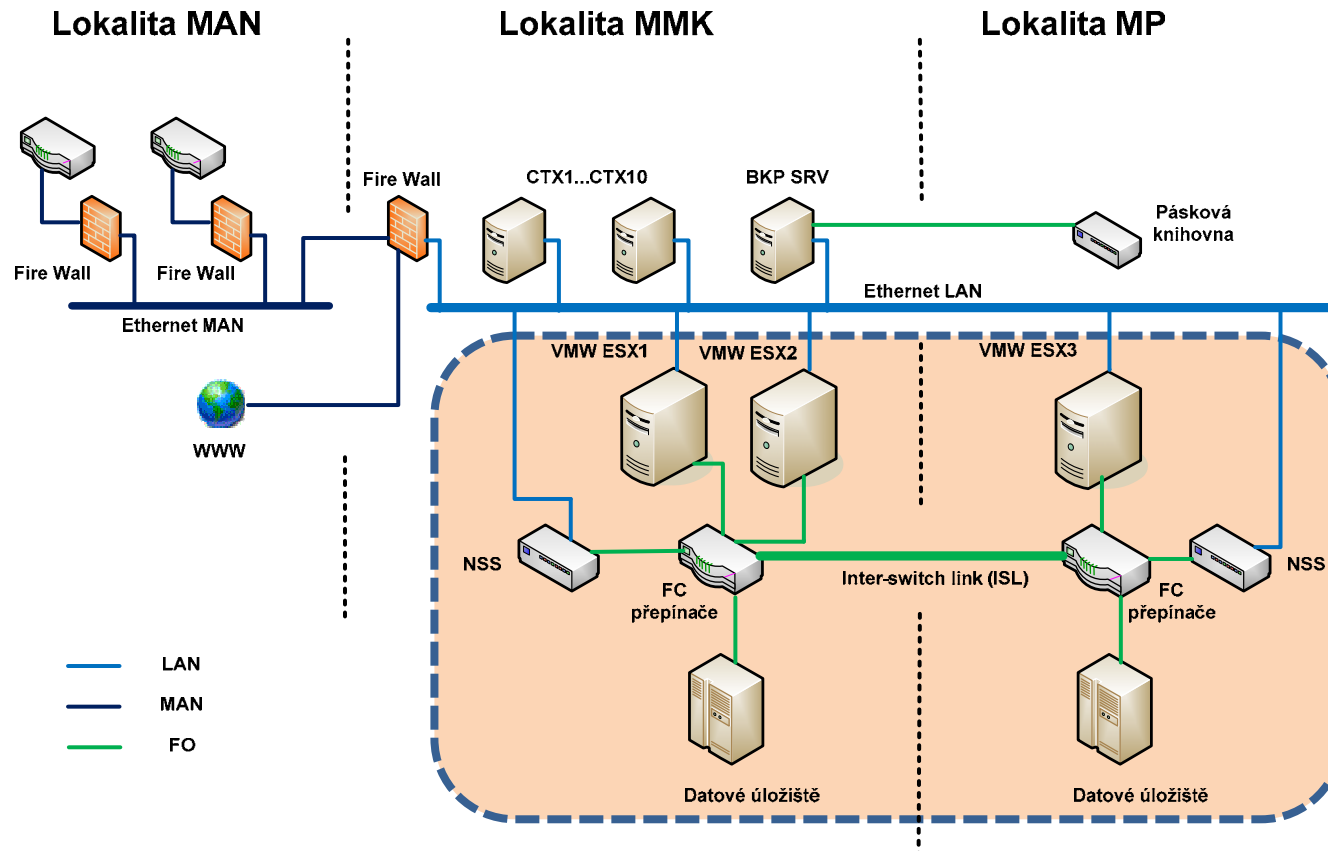

Zapojení TC ORP Kladno do Metropolitní sítě



- **Kde jsme narazili:**
 - **Dlouhá doba schvalování dotace – bude nutný posun ukončení projektu a slučování etap.**
 - **Kamery MP – dle vyjádření CRR a OSF se nejedná o výstražný systém krizového řízení, proto je nelze zařadit do projektu optické komunikační sítě.**
 - **Info tabule - dle vyjádření CRR a OSF je možné je zařadila pouze v případě, že budou podávat komplexní informace o městě např. pro turisty, nikoli pouze odjezdy autobusů.**
 - **Nejasnosti s napojením do KIVS.**



„Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Kladno “

- Listopad 2009 – podána žádost o dotaci
- Září 2010 – přidělena dotace
- Obsah projektu:
 - Vzdělávání zaměstnanců MMK, PO, obcí
 - Školení funkcionalit CzechPOINT
 - Školení MS Office 2003, 2007
 - Školení ISDS, certifikáty.....
- Finanční objem – 2 mil. Kč



- **Kde jsme narazili:**
 - **Dlouhá doba schvalování dotace – projekt bylo nutno realizovat již od roku 2009 (zprovoznění CzechPOINTů na obcích – Výzva IOP 02 – nutná školení, ISDS), ale neměli jsme schválenou dotaci – snaha o co nejmenší výdaje.**
 - **Dlouhé schvalování MZ – čekání na další finanční prostředky.**
 - **Přidán monitorovací indikátor v průběhu realizace projektu – velký problém s jeho naplněním.**
 - **Problémy uživatelů se základní obsluhou PC.**



„Řízení lidských zdrojů v ORP Kladno “

- Březen 2010 – podána žádost o dotaci
- Říjen 2010 – přidělena dotace
- Obsah projektu:
 - Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu
 - Nastavení interního systému vzdělávání
 - Implementace e-learningového prostředí
 - Vzdělávání zaměstnanců dotčených projektem (personalisté, vedoucí pracovníci, tajemník)
 - Tvorba vlastních vzdělávacích programů
- Finanční objem – 6 mil. Kč



- **Kde jsme narazili:**
 - Schvalování rychlé a bez problémů
 - Chyba ve VZ – zjednodušené podlimitní řízení – Výzva zaslána 5 uchazečům, vyvěšena na www.mestokladno.cz, na esfcr.cz, ale nevyvěšena na profilu zadavatele – museli jsme VZ zrušit a vypisujeme ji znovu.
 - Vysoutěžili jsme o hodně nižší cenu, než dle průzkumu trhu byla – OSF nám sdělilo, že by to mohl být problém, že jsme nadhodnotili projekt – budou zkoumat, jak jsme na dané ceny přišli.



„Moderní úřad-vzdělávání pro Statutární město Kladno“

- Listopad 2010 – podána žádost o dotaci
- Dotace zatím nepřidělena – věcné hodnocení OK
- Obsah projektu:
 - Aktualizace a upřesnění analýzy vzdělávacích potřeb
 - Začlenění vzdělávacích aktivit do systému vzdělávání úředníků MMK dle zákona 312/2002 Sb.,
 - E-learningového vzdělávání,
 - Sestavení a rozvoj interního lektorského týmu ,
 - Vzdělávání
- Finanční objem – 9 mil. Kč



Městský rok informatiky v Kladně 9. – 10. června 2011

Infocom, s.r.o.

4. Pracovní setkání informatiků pověřených obcí v Kladně listopad 2011

Statutární město Kladno

Děkujeme za pozornost



Statutární město Kladno

Ing. Simona Rákosová
simona.rakosova@mestokladno.cz

Ing. Pavel Rous
pavel.rous@mestokladno.cz

